重钢大学生宿舍保障性租赁住房项目“12·25”燃气泄漏事故调查报告

2023年12月25日，上午10时许，大渡口区应急局接重庆市应急管理局的下达指令，重钢大学生宿舍保障性租赁住房项目翻修工程在施工作业时，用破碎机将地下燃气管道打穿，燃气公司第一时间停周围燃气供应。经大渡口燃气分公司核实，该起事故造成约1500户居民停气6至7小时，无人员伤亡，直接经济损失约4000余元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求及区政府授权（大渡口府〔2022〕65号），和市安委会办公室的工作要求，成立由区应急局牵头，区公安分局、区经信委、区住房城乡建委、区城管局、区总工会等单位组成，并邀请区人民检察院、区纪委监委参加的重钢大学生宿舍“12·25”燃气泄漏事故调查组调查组并聘请市政府安全生产专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位人员的处理意见和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位及项目基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：重钢大学生宿舍保障性租赁住房项目；

建设单位：重庆钢铁（集团）有限责任公司；

监理单位：重庆三环建设监理咨询有限公司；

施工单位：重庆钢铁集团建设有限公司；

专业分包单位：重庆旭普达机电设备工程有限公司。

（二）事故单位基本情况

重庆旭普达机电设备工程有限公司，成立日期：2002年10月08日；营业期限：2002年10月08日至永久；公司类型：有限责任公司；住址：重庆市渝中区大坪正街***号*-*号；注册资金：伍仟万元整；统一社会信用代码：915001********0003；法定代表人：卢*；经营范围：许可项目：各类工程建设活动，职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售.....

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年12月25日，上午10时许，重庆旭普达机电设备工程有限公司在组织重钢大学生宿舍保障性租赁住房项目翻修工程施工作业时，由破碎机驾驶员柯*驾驶破碎机在重钢大学生宿舍门口翠园路与曾家村巷子交界处（参见图1）开挖施工，由于

开挖施工作业不慎，将埋于地下的燃气管道（中压 D114 钢管）打穿，造成了燃气管道破损，导致燃气泄漏。燃气公司第一时间关闭周围燃气供气阀门，经过大渡口燃气分公司对破损管道进行了紧急抢修，该区域于同日 18 时许恢复供气。该起事故造成约 1500 户居民停气 6 至 7 小时，无人员伤亡。

（二）应急处置及救援情况

事故发生后，重钢大学生宿舍保障性租赁住房项目立即对涉及燃气泄漏的区域现场布置警戒带，并立即拨打了大渡口燃气分公司的应急电话，110 报警电话，大渡口燃气分公司第一时间组织抢险人员赶赴事故现场，对破损的燃气管道进行抢修处理。区公安分局、区消防救援支队、区经信委、区应急局立即赶赴现场进行了应急处置。

三、人员伤亡情况

该事故未造成人员伤亡。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

重庆旭普达机电设备工程有限公司在未做燃气管道保护方案，且占用、挖掘作业未经城市管理部门行政许可的情况下，无视项目围挡两侧路面的燃气标识砖（明确标注：重庆燃气，中压，下有管线，严禁开挖，且有管线埋设走向指示箭头，参见图 2、3、4、5），采用机械开挖的施工方式，盲目实施路面开挖作业，

不慎打穿埋设于地下的燃气管道。

（二）事故间接原因

建设单位重庆钢铁（集团）有限责任公司，施工单位重庆钢铁集团建设有限公司，监理单位重庆三环建设监理咨询有限公司对项目开挖施工的监督巡查不到位，未发现专业分包单位重庆旭普达机电设备工程有限公司在未做燃气管道保护方案，且占用、挖掘施工作业未经城市管理部门行政许可的情况下，无视项目围挡两侧路面的燃气标识砖，采用机械开挖的施工方式，盲目实施路面开挖作业，不慎打穿埋设于地下的燃气管道。

（三）事故性质

本次事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对责任单位的处理意见

1.重庆旭普达机电设备工程有限公司在未做燃气管道保护方案，且占用、挖掘作业未经城市管理部门行政许可的情况下，无视项目围挡两侧路面的燃气标识砖，采用机械开挖的施工方式，盲目实施路面开挖作业，不慎打穿埋设于地下的燃气管道（参见图6），该施工作业造成了毁损天然气管道的结果，其行为分别违反了《重庆市天然气管理条例》第四十六条第二款的规定和《城市道路管理条例》第二十七条第一项的规定，建议交由区经信委、区城管局依照相关法律法规作出处理。

2.建设单位重庆钢铁（集团）有限责任公司，施工单位重庆

钢铁集团建设有限公司，监理单位重庆三环建设监理咨询有限公司对项目开挖施工的监督巡查不到位，未发现专业分包单位重庆旭普达机电设备工程有限公司在未做燃气管道保护方案，且占用、挖掘施工作业未经城市管理部门行政许可的情况下，无视项目围挡两侧路面的燃气标识砖，采用机械开挖的施工方式，导致开挖作业不慎打穿埋设于地下的燃气管道，造成燃气泄漏。建议交由区住房城乡建委按照相关规定进行处理。

（三）其他意见

事故调查组在事故调查过程中未发现区经信委、区住房城乡建委、区城管局存在失职渎职情况，建议不予追究上述单位及有关人员责任。

六、防范措施及建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）建设单位重庆钢铁（集团）有限责任公司，施工单位重庆钢铁集团建设有限公司要严格落实企业主体责任，加强对施工项目的巡查检查，建设单位要督促监理单位和施工单位按照相关规定落实安全生产工作。

（二）监理单位重庆三环建设监理咨询有限公司要切实加强对施工现场的安全管理，采取有效措施对施工单位的施工活动进行监督管理，发现违章行为要坚决制止。

（三）重庆旭普达机电设备工程有限公司要加强对相关法律法规的学习，对涉及可能危及地下管网的施工作业，严格按照相关规定做好保护方案，对涉及须经批准的项目，必须经相关部门批准，取得批准文件或许可证件后可后方可从事施工作业，切实履行安全责任，严格按照规范要求加强安全生产隐患排查，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

以上防范措施和建议由大渡口区住房城乡建委负责督促落实，并及时将整改落实情况报送大渡口区安委会办公室。

附件：事故发生地现场照片

重钢大学生宿舍保障性租赁住房项目

“12·25”燃气泄漏事故调查组

2024 年 1 月 5 日

附件：事故发生现场图片

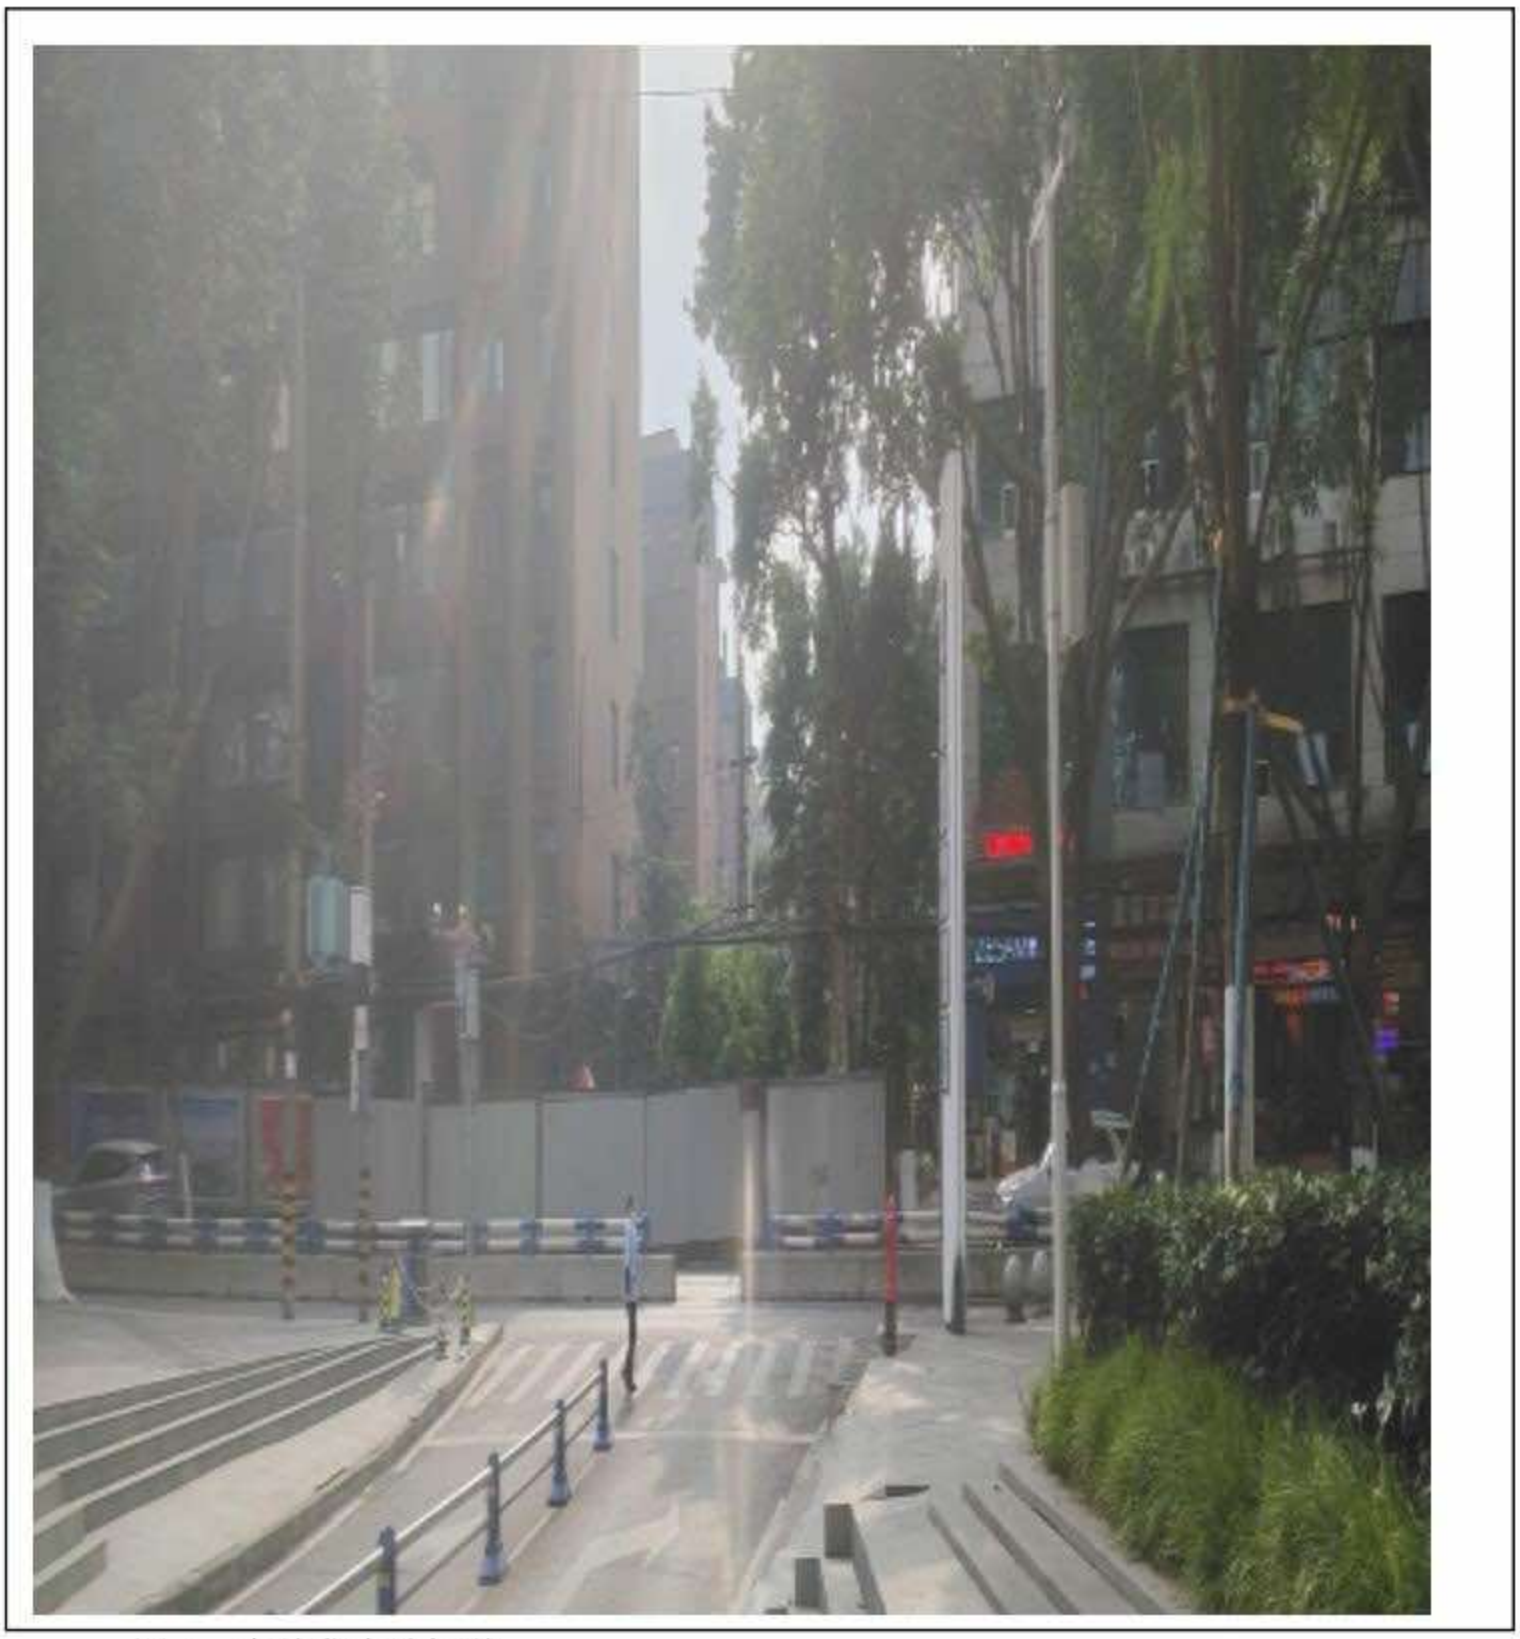


图 1：事故发生地概貌



图 2：事发地右侧约 15 米处燃气标识砖周边照



图 3：事发地右侧约 15 米处燃气标识砖近照



图 4：事发地左侧约 26 米处燃气标识砖周边照



图 5：事发地左侧约 26 米处燃气标识砖近照



图 6：破碎机操作员柯*辨认现场照片
