索 引 号：	/202406-00023	信息分类：	事故通报
内容分类：	其它	发文日期：	2024-06-18
发布机构：	金安区应急局	生成日期：	2024-06-18
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		废止时间：	
名　　称：	金安横塘岗金安温氏畜牧有限公司“3·16”一般生产安全中毒窒息事故调查报告（含应急处置措施和应对结果）		
文　　号：		关 键 词：	

金安横塘岗金安温氏畜牧有限公司“3•16”一般生产安全中毒窒息事故调查报告（含应急处置措施和应对结果）

发布时间：2024-06-18 11:20 信息来源：金安区应急局 阅读次数：12次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

2024年3月16日下午17时50分左右，六安市金安区横塘岗乡金安温氏畜牧有限公司种猪场内发生一起中毒窒息事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约为141万元。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，3月27日，经区政府批准，依法成立横塘岗乡金安温氏畜牧有限公司“2024·3·16”亡人事故调查组（以下简称事故调查组），调查组由区应急管理局牵头负责，区畜牧水产中心、区人社局、区总工会、区公安分局为成员单位联合组成，同时，邀请区监察委员会参加，并聘请了两名行业专家参与事故调查工作。


事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、勘察现场、查阅资料、询问相关当事人等，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

事故调查组认定：该起中毒窒息事故是一起因为作业人员违反操作规程，作业前未打开排气扇、佩戴防护用具，吸入硫化氢等有毒气体造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

金安温氏畜牧有限公司由温氏食品集团股份有限公司于2016年9月在六安市金安区投资创建，主营养猪业务，2019年在横塘岗乡建成金安区第一个高效化生态养殖项目种猪场，隶属于金安温氏畜牧有限公司管辖，组织架构为五级生产单位，场址位于横塘岗乡龙王岩村境内，占地面积540亩，养殖栏舍17栋，建筑面积45555㎡，栏舍面积33955㎡，劳动定员80人，总投资约1.6亿元。**本次事故发生在四线分娩舍1栋的四单元。**

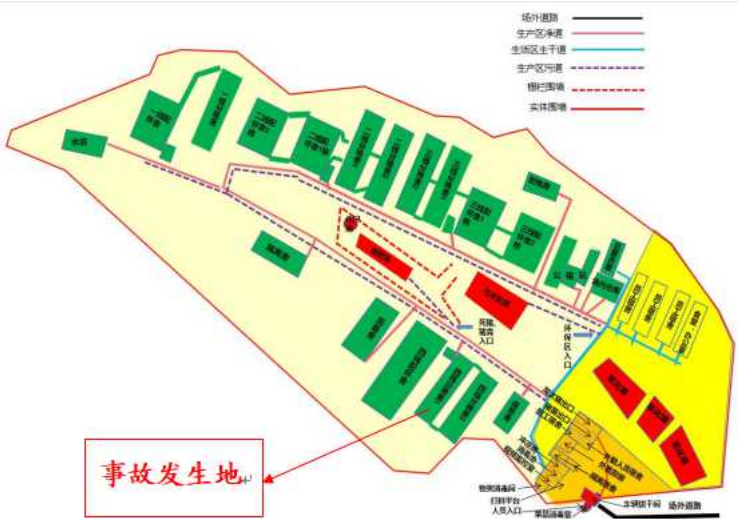

公司统一社会信用代码：91341502MA2N0TX86Y（1—1），法定代表人：邹某盛，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：贰仟肆佰万元整；登记机关：六安市金安区市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所：六安市金安区孙岗镇连墩村，经营范围：生猪养殖、销售；种猪养殖、销售；饲料加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可）。

（二）企业安全管理情况

金安温氏畜牧有限公司总经理为邹某盛，2021年12月31日聘任李某林为金安温氏畜牧有限公司总经理，委托其负责公安公司全面工作。金安温氏畜牧有限公司公司成立了安全管理领导小组，李某林任组长，是公司安全生产第一责任人，李某主持横塘岗乡养猪场全面工作，方某是公司的专职安全员。金安温氏畜牧有限公司编制了安全生产责任制、安全生产责任承诺、隐患排查治理等安全制度，厂内每个月会自发组织安全培训，培训方式以现场培训为主。

（三）分娩舍清粪流程

分娩舍清粪流程是分娩一次，清粪消毒一次，每次清粪前都要通风，先要将栏面上的猪粪清理掉，粪道2米宽，长度是20米，高度是65至75厘米，上面是镂空的隔板，种猪在隔板的上层活动，粪道末端是个洞口，排粪的时候将洞口的阀门打开，粪便就会通过管网自动流入积粪池，自动排粪后粪道内大概还剩下5公分左右的粪渣，公司会安排人员进行手动清粪，操作人员在作业时必须带防毒面具或口罩，佩戴防护用具，使用30x60cm的带铁把手塑料板进行手推，猪粪会通过粪道慢慢流下去。

（四）事故发生经过

2024年3月16日17时11分左右，横塘岗乡养猪场分娩舍四线组长赵某艳安排金某德和莫某申两人去四单元分娩舍粪沟进行清粪工作，金某德由于腿脚不方便，便安排他浸泡猪笼垫，让刚上班的实习生刘某乐下粪道清粪，这是她第一次清粪，莫某申之前做过几次，先下去作业示范了几分钟，随后两个人便一起在粪道进行推粪，作业前两个人未打开排风扇排风，也未佩戴防护用具、口罩等。刘某乐刚推完两至三个栏后就感觉身体不适，大约过了没多久两个人就晕倒了，晕倒时刘某乐面朝上可以看到外面出口，莫某申晕倒后脸埋在猪粪里，不多久刘某乐自己醒来后呼叫晕倒的莫某申，并没有回应，便爬到上面呼喊正在弄栏铁的金某德，随后金某德喊赵某艳一起将莫某申抬到厂房外，并立即给他做心肺复苏进行抢救。

（五）事故现场情况

事发地点位于金安温氏畜牧有限公司四线分娩舍1栋的四单元，长21.4米，宽2.2米，漏粪地沟深度73厘米。事发时粪地沟出入口格栅为去除状态，人员出入不受限，且高度较低，在地沟内站立后人员可脱离沼气浓度较大区域。

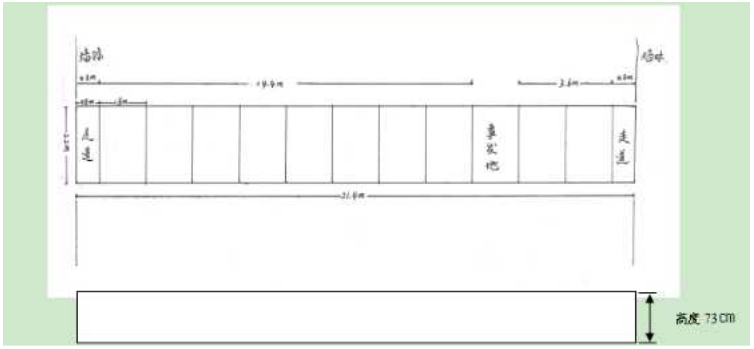


图1 四线分娩舍1栋四单元示意图

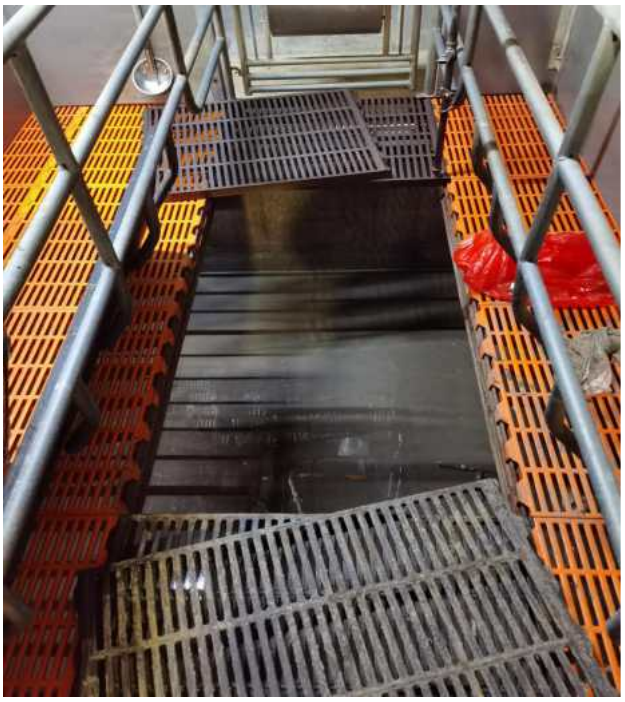


图2 事故发生地格栅状态

（六）事故现场勘查情况

2024年3月21日，金安区应急管理局出具《技术鉴定委托》邀请两名专家，前往横塘岗乡金安温氏畜牧有限公司事现场进行了实地勘查和技术鉴定，经过两名专家实地勘察后得出鉴定结论为：金安温氏畜牧有限公司作业人员在地沟内理作业过程中，由于需要下蹲作业，在连续翻动粪便过程中造成沼气集聚，吸入浓度过高造成晕厥昏倒（具体情况见附

1）。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 死亡人员：莫某申，性别：男，身份证号码：533025********2411，户籍地：云南省保山地区昌宁县。

2. 受伤人员：刘某乐，性别：女，身份证号码：411722********6121，户籍地：河南省驻马店市上蔡县。

3. 事故直接经济损失：按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）统计，事故造成直接经济损失约为141万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月16日下午18时左右，金安区应急管理局接横塘岗乡人民政府电话报告后，立即派人前往事故现场进行调查核实，并及时向六安市应急管理局报告事故相关情况。同时，公安部门到达现场后，第一时间对事故现场进行保护，设置警戒线，禁止人员入内，维护现场秩序，为后续事故调查提供原始现场。

（二）事故现场应急处置及评估情况

事故发生后，金安区人民政府能够及时启动应急预案，组织开展应急救援和善后处置工作，应急、消防、医疗、公安等部门响应迅速，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好地做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理以及舆情管控工作，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了各部门职责。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生以后，现场人员立即拨打了120和110，刘某乐当时已经清醒，莫某申依旧昏迷不醒，副厂长朱某在等待12救护车到达之前一直在给莫某申做心肺复苏，120救护车到达现场后，分别将2名伤者送往六安市人民医院和六安市第四人民医院，莫某申经抢救无效死亡，刘某乐在六安市第四人民医院接受检查后发现并无大碍，住院观察几天后便办理了出院手续。

3月18日，在横塘岗乡人民政府主持调解下，金安温氏畜牧有限公司负责人与死者家属签订了《赔偿协议书》，一次性赔偿141万元，同时，刘某乐在住院期间治疗费用也由金安温氏畜牧有限公司负责承担。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是金安温氏畜牧有限公司作业人员违反操作规程，在作业前未及时打开排风扇、未按标准要求佩戴个体防护装备的情况下进入四单元分娩舍进行清粪作业，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 金安温氏畜牧有限公司未严格督促作业人员执行企业安全生产操作规程，对从业人员安全生产教育和培训不足，作业前未进行企业内部审批，作业现场无专职安全员看护。

2. 属地党委、政府管理不到位及行业主管部门指导服务力度不够。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

金安温氏畜牧有限公司未认真落实企业安全生产管理职责，安全生产管理不到位；未对从业人员进行完整的安全生产教育和培训；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。企业自查安全隐患不上报，并严格执行非洲猪瘟疫情防控，造成行业监管、属地管理不到位。

（二）地方党委政府及行业监管部门

1. 金安区横塘岗乡人民政府，履行属地管理责任不到位，责任压实有差距。以防控非洲猪瘟疫情为由，未对金安温氏畜牧有限公司种猪场进行有效安全监管，安全监管存在盲区，督促、指导畜牧养殖企业隐患排查治理不到位，对事故发生负有属地责任。

2. 金安区畜牧水产技术服务中心，作为行业主管部门履行“三管三必须”不到位，对养殖企业提供安全指导服务不到位。因防控非洲猪瘟疫情，对金安温氏畜牧有限公司种猪场安全监管存在盲区，整治养殖企业安全隐患还存有漏洞和薄弱环节，对事故发生负有监管责任。

五、事故主要教训

（一）企业安全管理混乱。一是全员安全生产责任制落实不到位。部分安全生产责任制缺乏针对性，安全生产责任未有效压实到一线员工。二是作业人员安全意识不强。对进入厂房作业风险辨识不足，作业前未及时打开排风扇，操作流程不规范。三是应急预案和演练缺乏针对性。金安温氏畜牧有限公司近年来开展应急演练情景过于简单，救援程序不够具体。

（二）属地政府及有关部门履行监管不力。一是区畜牧水产中心未严格落实“三管”要求，对封闭式畜牧行业安全生产工作督促指导不够，监管检查不够。二是横塘岗乡人民政府未能统筹好发展和安全，属地监管认识存在偏差，监管存在盲区。三是属地政府与行业监管部门联系较少，安全生产联合检查和隐患排查次数较少，监管未形成统一合力。

六、事故整改和防范措施

（一）金安温氏畜牧有限公司，一要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，将安全生产责任层层压到班组和一线员工，确保不漏一岗、不漏一人；二要规范作业现场的操作流程，严格作业过程中管理制度和操作规程执行的监督管理；三要加强员工安全教育培训和应急演练工作，提高从业人员的安全意识。

（二）金安区横塘岗乡人民政府，一要深刻吸取事故教训，举一反三，切实履行好属地安全监管职责；二要与行业主管部门建立有效的沟通渠道，建立信息共享机制，全面加强辖区内畜牧领域安全监管，提高监督检查效能；三要深入封闭厂区加强监督检查，及时发现、纠正作业现场存在的各类违法、违规、违章行为，坚决预防生产安全事故的发生。

（三）金安区畜牧水产技术服务中心，一要深刻吸取事故教训，举一反三，牢牢守住安全底线；二要压实安全监管责任，着力化解重大安全风险，有效管控一般安全风险；三要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，加强对畜牧安全生产领域的督促指导，形成齐抓共管的良好局面。
